

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐/๐๓/๒๕๖๘ และสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘/๐๕/๒๕๖๘ ระหว่างเทศบาลตำบลก๊ก กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาลานทกมิกก่อสร้าง คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคาที่เหมาะสมมาพร้อมนี้ โดยคงเหลืองบประมาณเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๓๓๑,๘๑๓.๒๕ (สองล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบสามบาทยี่สิบเก้าสตางค์) เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๑๕ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๘ จนถึง ๐๓/๐๗/๒๕๖๘ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๕/๐๔/๒๕๖๘	๗๒๐,๐๐๐.๐๐			๗๒๐,๐๐๐.๐๐
๒	๒	๑๕/๐๕/๒๕๖๘	๖๗๔,๕๒๒.๘๓			๖๗๔,๕๒๒.๘๓
๓	๓	๐๓/๐๗/๒๕๖๘	๙๓๖,๘๙๐.๔๒			๙๓๖,๘๙๐.๔๒

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสิริธร บัวแก้ว)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายณฤเบศร์ ใจภาโต)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายวิภัทร ชุ่นเส่ง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายวัชรพงษ์ จันทร์หนู)





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลตำบลคึกคัก โทร. ๐ ๗๖๔๘ ๗๔๖๖

ที่ พง ๕๒๔๐๓/๓๓๑

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและตัดลดค่างานก่อสร้างโครงการ ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ขอยุ้งขม้นกลาง-ขอยตาคอง)/(ขอยุ้งขม้นเหนือ-บางตาเทียน-ขอยต่าบ) หมู่ที่ ๔ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคาตามสัญญาเดิมและที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ จำนวน ๑ แผ่น

๒. แบบแปลนที่แก้ไข

จำนวน ๒ แผ่น

๓. คำสั่งเทศบาลตำบลคึกคัก ที่ ๙๖๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ แผ่น

### เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ และคำสั่งเทศบาลตำบลคึกคัก ที่ ๙๖๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงาน โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ขอยุ้งขม้นกลาง-ขอยตาคอง)/(ขอยุ้งขม้นเหนือ-บางตาเทียน-ขอยต่าบ) หมู่ที่ ๔ โดยมีปริมาณงานวางท่อจ่ายน้ำ HDPE ๑๐๐ ขนาด ๙๐ มม. และ ขนาด ๖๓ มม. PN ๖ ระยะทางรวม ๘,๕๔๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลคึกคัก) เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๑๑๕ วัน ในวงเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

### ข้อเท็จจริง

กำกับส่วนกำกับ  
มาลาบทักซึนก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ตามบันทึกผู้ควบคุมงาน ที่ พง ๕๒๔๐๓/๓๒๘ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ขอยุ้งขม้นกลาง-ขอยตาคอง)/(ขอยุ้งขม้นเหนือ-บางตาเทียน-ขอยต่าบ) หมู่ที่ ๔ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ข้อเท็จจริงตามรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น โดยได้แนบเอกสารบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคาตามแบบสัญญาเดิมและตามแบบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

โดยมีปริมาณงานและราคาตามแบบเดิม มีค่าก่อสร้างรวม ๓๘,๑๓๙.๐๕ บาท (สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสตางค์) ปริมาณงานและราคาตามแบบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ มีค่าก่อสร้างรวม ๑๕,๐๒๙.๕๔ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันยี่สิบเก้าบาทห้าสตางค์) จึงสรุปรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและปรับลดค่างาน ดังนี้

- |   |                    |
|---|--------------------|
| ๑. วงเงินตามสัญญาจ้าง                         | = ๒,๓๕๔,๙๒๒.๘๓ บาท |
| ๒. ปริมาณงานในส่วนที่แก้ไข ตามแบบและสัญญาเดิม | = ๓๘,๑๓๙.๐๕ บาท    |
| ๓. ปริมาณงานตามแบบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่     | = ๑๕,๐๒๙.๕๑ บาท    |

ค่างานก่อสร้างที่ปรับลด

คงเหลือวงเงินตามสัญญา

รายการใหม่ได้ทำการตัดลดปริมาณและวงเงิน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๑๓๙.๐๕ - ๑๕,๐๒๙.๕๑ = ๒๓,๑๐๙.๕๔ บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าบาทห้าสตางค์) คงเหลือวงเงินตามสัญญา ๒,๓๕๔,๙๒๒.๘๓ - ๒๓,๑๐๙.๕๔ = ๒,๓๓๑,๘๑๓.๒๙ บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบเก้าสตางค์) รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคาแนบมาพร้อมนี้แล้ว

**ข้อระเบียบ/ กฎหมาย**

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ การทำสัญญา มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

หมวด ๕ การทำสัญญาและหลักประกัน ส่วนที่ ๓ การก่อสร้าง ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้ารับจ้าง

หน่วยงานของรัฐ

ลงชื่อ.....พยาน

การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระทำได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖

วรรคสอง

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

หมวดที่ ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณภาพของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงดำเนินการตาม (๖)

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

๔. สัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นควรแจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน(บางส่วน)จนกว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการแล้วเสร็จ

๒. เห็นควรให้ตัดลดปริมาณงาน และวงเงินคิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๑๐๙,๕๔๖ บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์) คงเหลือ วงเงินตามสัญญาจ้าง ๒,๓๓๑,๘๑๗.๒๙ บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบสามบาทยี่สิบบาทห้าสตางค์) ตามรายละเอียดแบบแปลนและบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานที่แนบมาพร้อมนี้



กำกับส่วนราชการ  
 บาลานท์กึ่งก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง


ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....พยาน


ลงชื่อ.....พยาน


จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


ยินดีให้ปรับลดค่างานเป็นเงิน ๒๓,๑๐๙.๕๔ บาท  
(สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าบาทห้าสิบสี่สตางค์)  
และยินดีรับทำให้โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นใด


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  
(นายประจิม ถั่วทอง)





ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวจารุณี มีประเทศ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ  
(จำเอกภูริวัจน์ สิรินนทพัทธ์)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่  


  
(นายประจิม ถั่วทอง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก  


  
(นายปรพล พรหมเกิด)  
ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

คำสั่ง นายศเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ


  
(นายสิริธร บัวแก้ว)  
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

  
กำกับส่วนจำกัด บาลานท์กักยึกก่อสร้าง  
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
ลงชื่อ.....พยาน  
ลงชื่อ.....พยาน

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา

โครงการ ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ขอยุ่งขม้นกลาง-ขอยตาคลอง)/(ขอยุ่งขม้นเหนือ-บางตาเทียน-ขอยตาบ่) หมู่ที่ 4 ต.ตีกอก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 ปริมาณราคาโดย นายกมล สุขเกษม เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน หัวหน้าผู้ควบคุมงาน นายนิล วารี ผู้ควบคุมงาน

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่รายการ	ปริมาณงานและราคาเดิม							ปริมาณงานและราคาใหม่								
		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1	ขยายเขตระบบประปา(ขอยุ่งขม้นกลาง-ขอยตาคลอง)																
1.1	ขอยุ่งขม้นกลาง 2																
	ท่อ HDPE 100 Dia. 63 มม. PN 6	88.00	เมตร	7,047.04	6,454.45	24.02	2,113.76	9,160.80									
	งานร้อยฝิวคอนกรีต (เดิม)	12.84	ตร.ม.	-	-	96.73	1,242.01	1,242.01									
	งานคืนสภาพผิวทางคอนกรีต	12.84	ตร.ม.	561.01	7,203.37	-	-	7,203.37									
	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	26.40	ลบ.ม.	-	-	19.60	517.44	517.44									
	กลับดินกลับด้วยเครื่องจักร	26.08	ลบ.ม.	-	-	9.60	250.37	250.37									
1.2	ขอยุ่งขม้นกลาง (ฝั่งขวาปลายสุด)																
	ท่อ HDPE 100 Dia. 63 มม. PN 6								88.00	เมตร	80.08	7,047.04	24.02	2,113.76	9,160.80		
	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร								26.40	ลบ.ม.	-	-	19.60	517.44	517.44		
	กลับดินกลับด้วยเครื่องจักร								26.08	ลบ.ม.	-	-	9.60	250.37	250.37		
1.3	ขอยุ่งขม้นกลาง (ส่วนที่ฝั่งท่อประปาไม่ได้)																
	ท่อ HDPE 100 Dia. 63 มม. PN 6								49.00	เมตร	80.08	3,923.92	24.02	1,176.98	5,100.90		
	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	14.70	ลบ.ม.	-	-	19.60	288.12	288.12									
	กลับดินกลับด้วยเครื่องจักร	14.52	ลบ.ม.	-	-	19.60	139.39	139.39									
	งานร้อยฝิวคอนกรีต (เดิม)	29.40	ตร.ม.	-	-	96.73	2843.86	2,843.36									
	งานคืนสภาพผิวทางคอนกรีต	29.40	ตร.ม.	561.01	16,493.69	-	-	16,493.69									
	รวม							38,139.05									
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							38,139.05									15,029.51
								TOTAL									TOTAL



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
 ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
 ลงชื่อ.....พยาน  
 ลงชื่อ.....พยาน

- สรุปรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและปรับเพิ่มค่างาน ดังนี้
- 1) วงเงินตามสัญญาจ้าง = 2,354,922.83 บาท
  - 2) ปริมาณงานตามแบบรูปรายการและสัญญาเดิม(ในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง) = 38,139.05 บาท
  - 3) ปริมาณงานตามแบบรูปรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ = 15,029.51 บาท
  - 4) ผลต่างปริมาณงานเดิม/งานใหม่ 38,139.05 - 15,029.51 = 23,109.54 บาท

ตัวอักษร (-สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าบาทห้าสิบลีตต่างค์-)

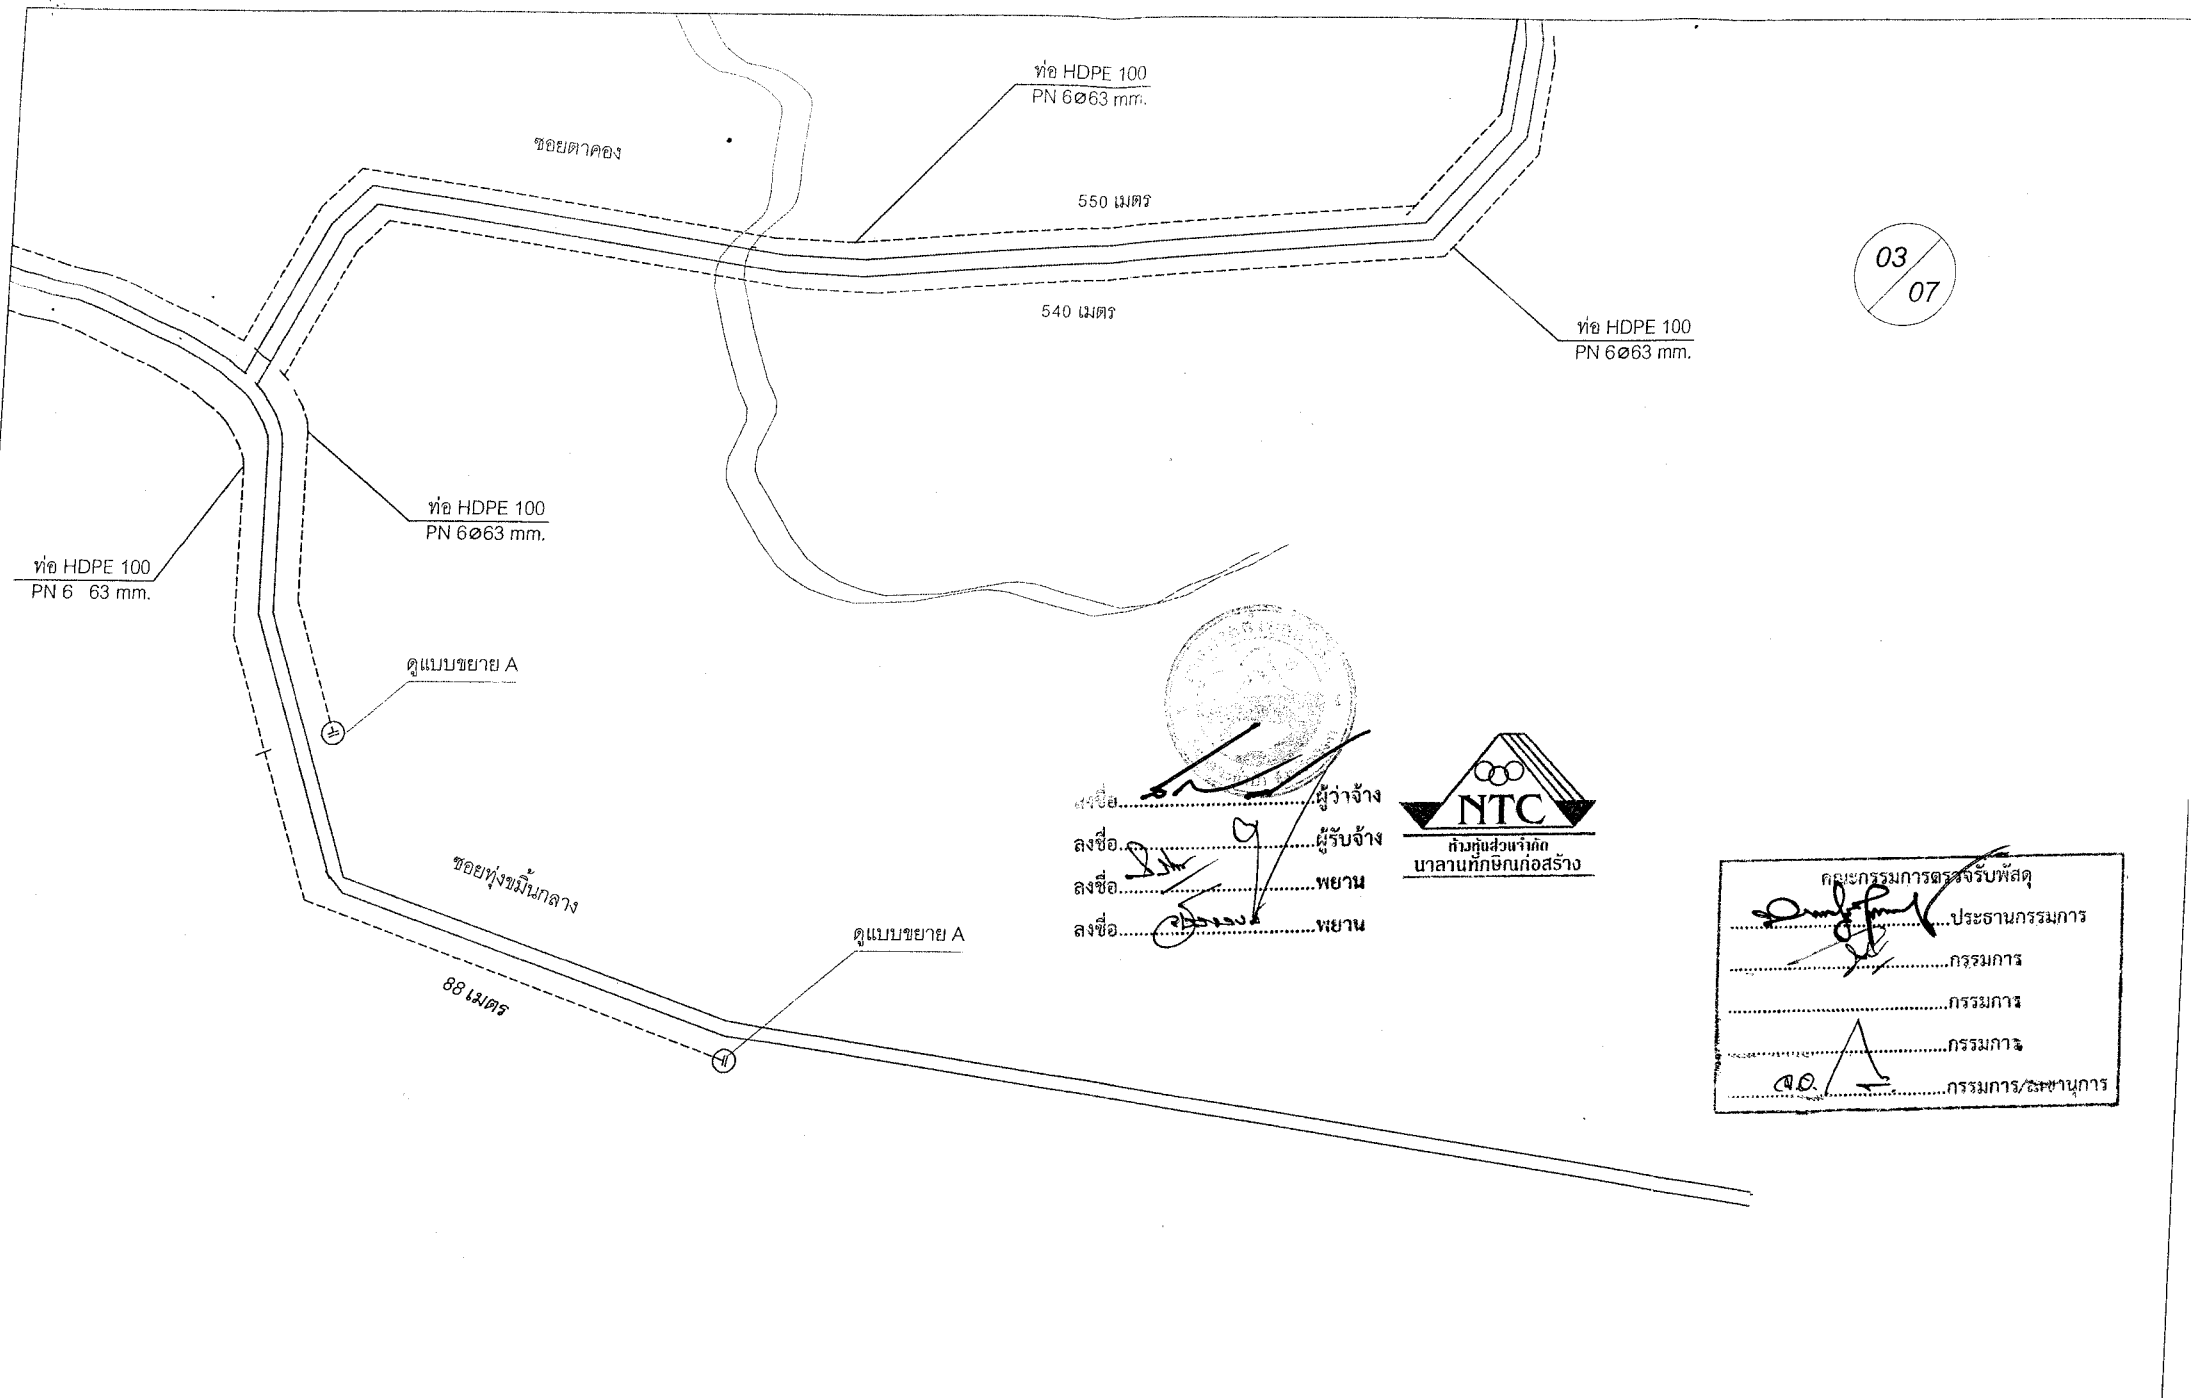
(ลงชื่อ).....หัวหน้าผู้ควบคุมงาน  
 (นายกมล สุขเกษม)  
 (ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน  
 (นายนิล วารี)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายประจิม สิงทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางสาวจารุณี มีประเทศ)


(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ  
 (จำเอกสุริวิวัฒน์ สิริบนทพันธ์)





03 / 07

ผู้ว่าจ้าง  
 ผู้รับจ้าง  
 พยาน  
 พยาน



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
 ประธานกรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ/เลขานุการ
